

Le contexte

Les zones humides sont de véritables réserves de biodiversité, accueillant une multitude d'espèces inféodées à ces milieux.

C'est notamment le cas du brochet, dont l'accès aux zones humides permet la réussite de sa reproduction. Ce poisson, classé vulnérable (liste rouge UICN), se voit menacer par la dégradation et la disparition des zones humides.

C'est pourquoi, des opérations d'aménagement de frayère sont mises en place.

C'est le cas dans la commune de Brissy Hamégicourt, où la [Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de l'Aisne](#) et l'AAPPMA «S'Béchois Ribermontois» ont souhaité restaurer un ancien méandre de l'Oise qui n'est plus en communication directe avec la rivière. Ce site est juxtaposé sur une parcelle communale et sur une parcelle privée. L'accord des deux parties a permis de faciliter les travaux et la gestion du site.



Cours d'eau	Oise
Code masse d'eau	FRHR177A
Coordonnées L93	x : 727 242 m y : 6 961 291 m
Appellation	Fraysère de Brissy-Hamégicourt
Superficie	0.1 ha
Espace naturel remarquable	ZNIEFF

Les enjeux

Améliorer la **fonctionnalité piscicole** du milieu, contribuer à l'atteinte du **bon état écologique** de la masse d'eau.

Les **zones humides** habitent de nombreuses espèces. Par la restauration de frayère, de nombreuses autres espèces vont pouvoir profiter des aménagements, que ce soit des poissons tels que les **cyprinidés**, les **amphibiens**, ou encore les **oiseaux**.

Les étapes

2016

Montage des dossiers

2017

Réalisation des travaux



Site avant travaux, 2017



Site après travaux, 2017

Le témoignage

«La frayère de Brissy est une réussite.

La présence de juvénile aperçus cette année atteste de sa fonctionnalité. Elle a été conçue en pente inversée, ce qui permet aux juvéniles de dévaler vers l'Oise lorsque le niveau de l'eau diminue, et ainsi de limiter la mortalité.


A noter qu'en 2019 le niveau de l'eau était trop faible pour alimenter la frayère, qui n'a donc pu servir de site de reproduction.»

Patrick Dufour, président de l'AAPPMA «S'Béchois Ribemontois»



Site 1 an après travaux, 2018

Le plan de financement

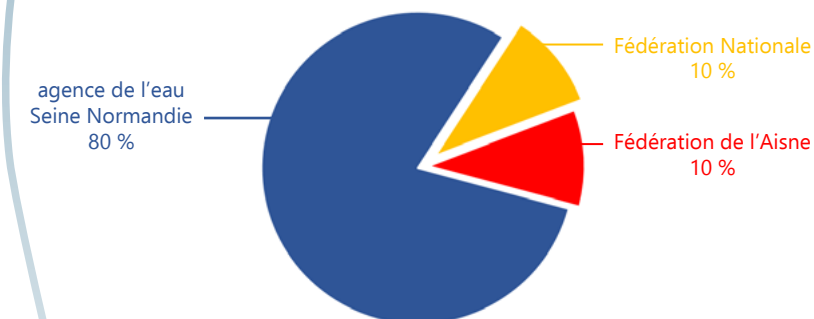

Le descriptif des travaux

- Déboisement de la parcelle
- Travaux de terrassement
- Mise en place d'un ouvrage de maintien des eaux afin de limiter le risque d'exondation des oeufs.
- Ensemencement de la parcelle

Ci-dessous : vue de la partie haute, ci-contre : vue de la partie basse de la frayère, 2017



Déboisement du secteur, 2017



Abattage des peupliers, 2017



Retalutage des berges en pente douce, 2017

Le gain écologique

2018

Reproduction avérée du brochet

2020

Présence de juvéniles de brochet



Site 1 an après travaux, 2018

L'attention particulière

Lors de la mise en œuvre des travaux, il a été décidé que le syndicat assure l'entretien de la frayère dans le cadre de ses programmes de travaux d'entretien/restauration

Les clés de la réussite

Une pêche électrique sera effectuée par la Fédération de l'Aisne pour la Pêche et pour la Protection du Milieu Aquatique ; elle permettra d'évaluer l'efficacité des aménagements réalisés.



- Site accessible :
 - Parcelle près de la route
 - Facilite l'entretien et le suivi de la frayère
- Parcelle située en aval d'un ouvrage infranchissable : permet la reproduction des poissons localisés sur ce bras de l'Oise.

- Faible surface de l'aménagement : la frayère est située sur une parcelle de petite taille et sur une dépression de taille assez faible : bouger une trop grande quantité de terre aurait été compliqué, à la fois pour le coût, mais aussi pour le côté réglementaire (zone inondable réglementée par un PPRI).

Le coût du projet

Aménagement de la frayère

11 839.20 € TTC



Contactez le responsable technique de l'action :
rmarlot@peche02.fr
